群聊 AI 项目管理智能体 · Demo 操作展示说明

> 本文档配合飞书「手拉手项目团队」群中的演示 demo，说明当前 Agent 已经跑通的核心能力。
> 阅读对象：需要快速了解 demo 形态与功能的团队成员。

Demo 背景

- **模拟项目**：长城证券内部数字化平台迭代（包含长城长、手拉手协同平台、商机广场）。
- **模拟团队**：「手拉手项目团队」群，成员包括杨一骢、徐亚琴、前端、后端、测试、产品实习生杨坤，以及群主本人。
- **Agent 角色**：「项目管理 Agent」，在群中旁观成员对话，自动执行需求登记、排期更新、状态流转、风险提醒、决策日志维护等操作。
- **数据载体**：飞书多维表格（需求池 / 任务表）+ 飞书多维表格（决策日志）。

> 说明：以下截图来自 2026-08-06 的真实演示过程，仅为 demo 效果展示，不代表真实业务系统已上线。

一、项目管理多维表格

1.1 项目数据统计看板



当前 demo 中维护的需求池共 **11 条任务**，其中 7 条未开始、0 条已完成。看板展示了：

- 任务总数、已完成任务数、未开始任务数；
- 各项目（手拉手·商机广场二期、手拉手·协同平台优化、手拉手·AI 助手接入、长城长·商机消息推送）的任务分布；
- 任务状态流向桑基图；
- 项目倒计时与任务负责人分布。


1.2 关键任务列表



需求池以表格形式记录每条任务的：任务名称、所属项目、状态、开始/截止时间、优先级、任务执行人。图中可见部分任务示例：

- 商机广场详情页「审核人员」→「审核员」三端改版
- 商机广场列表页筛选条件优化
- 协同平台申请流程字段扩展：新增「申请原因」+「期望时间」
- 研发团队群 AI 助手需求梳理
- 长城长 App 增加消息推送功能（新商机匹配）

1.3 任务状态看板

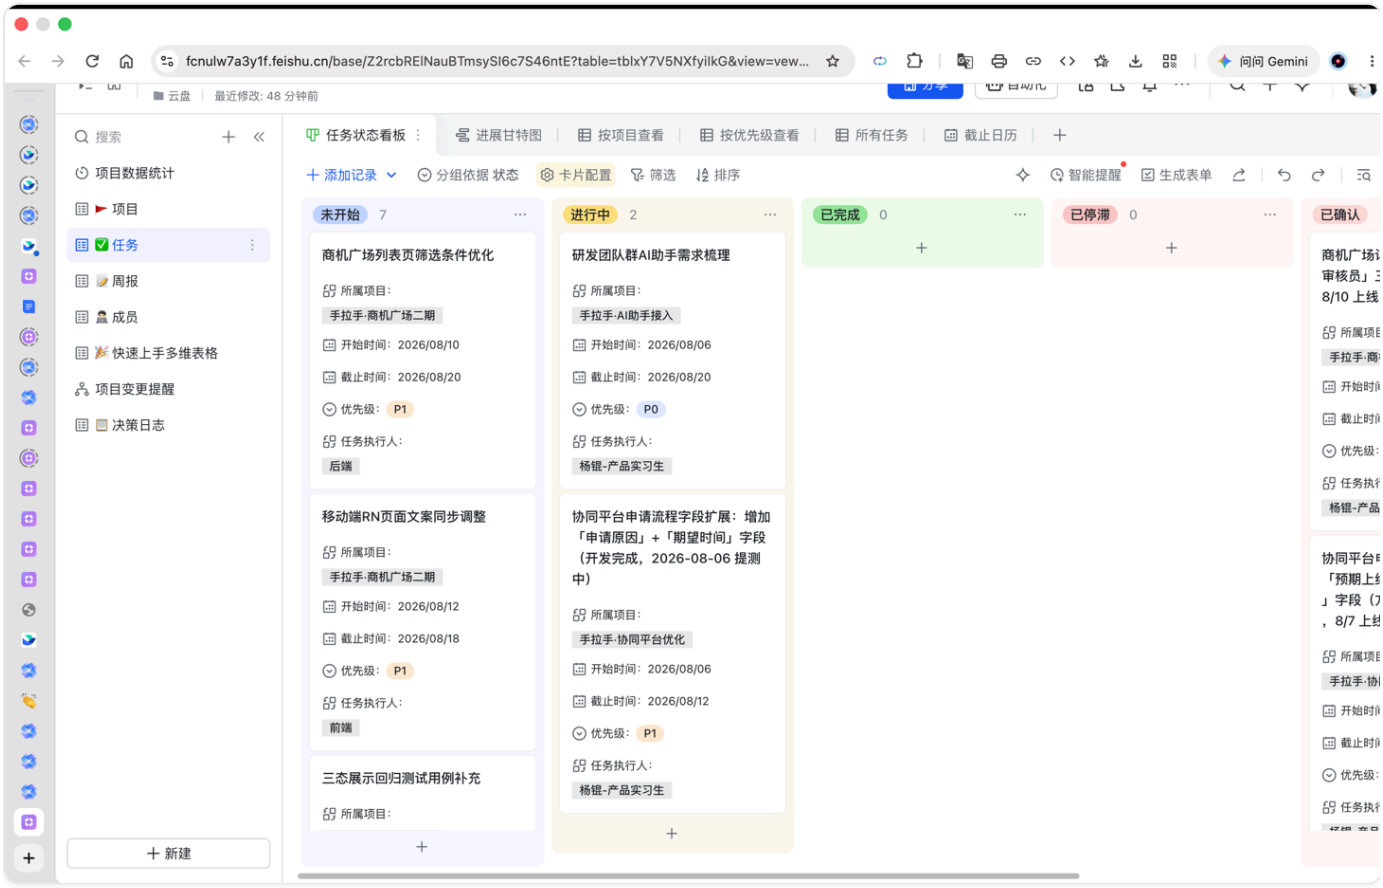

同一个需求池可以切换为看板视图，按「未开始 / 进行中 / 已完成 / 已停滞 / 已确认」五列展示任务，便于快速查看整体进展。

二、群聊场景演示

Step 1：新需求提出，Agent 自动识别并建议合并



群聊过程：

1. 杨一骢在群里 @所有人 提出：协同平台申请流程目前只收集姓名和联系方式，业务反馈需要增加「申请原因」和「期望时间」两个字段，并询问本周能否排上。
2. 后端、前端分别评估工作量。

Agent 行为：

- 自动识别这是一条新需求；
- 发现它与当天上午另一个「协同平台申请流程字段扩展」任务高度相似；

- 在群里回复「新需求已登记 + 合并建议」，并给出两个需求的字段、业务来源、状态、截止、本质等维度的对比表，供决策人参考是否合并。

Step 2：决策拍板后，Agent 自动建任务



群聊过程：

- 杨一骢拍板：后端 1 天、前端半天、测试半天，总排期 2 天，周三上线，优先级 P1，由杨锟跟进。

Agent 行为：

- 收到拍板信息后，自动完成三件事： 1. 在需求池中新建任务「协同平台申请流程字段扩展：增加『申请原因』+『期望时间』」； 2. 自动填充任务字段：所属项目、状态（未开始）、优先级

（P1）、任务执行人（后端）、开始时间（2026-08-06）； 3. 在群里发送确认消息，展示已创建的任务详情。

Step 3：开工反馈后，Agent 自动更新排期



群聊过程：

- 杨锟（产品实习生）反馈：需求已收到，今天开始开发，预计周三能提测。

Agent 行为：

- 识别为开工反馈，自动更新任务开始时间；
- 回复「排期已落表」，并展示最终排期：任务名称、原排期、杨锟反馈、Agent 的处理结果。

Step 4：Agent 主动识别资源冲突风险



Agent 行为：

- 在开工反馈后，Agent 主动分析发现：8/7 的 P0 任务与 8/12 的 P1 任务都依赖后端 + 前端资源；
- 如果 8/7 的任务延迟到 8/8，8/10 的 P1 任务将受影响；
- 给出「PM 解读」：杨锟提前 4 天开工比原排期更乐观，意味着 8/12 上线有充裕 buffer，但要警惕 8/7 的 P0 任务还在收尾、别互相抢资源；
- 向杨锟提出 3 条澄清提示，帮助把模糊承诺变成可执行的排期。

Step 5：开发完成后，状态自动流转



群聊过程：

- 杨锟反馈：协同平台字段扩展已开发完成并提测，测试通过即可上线。

Agent 行为：

- 识别为开发完成 + 提测事件；
- 自动将任务状态从「未开始」更新为「进行中（开发 → 提测，测试中）」；
- 在群里同步更新后的任务状态与 record_id。

Step 6：@Agent 更新决策日志



群聊过程：

- 群主 @项目管理 Agent：「请更新一下决策日志。」

Agent 行为：

- 自动新建「决策日志」多维表格；
- 将当天群聊中产生的 4 条关键决策全部入库，包括： 1. 商机广场「审核人员」→「审核员」三端改版（方案 A'） 2. 协同平台字段扩展（4 字段，方案 A，引用「业务负责人」） 3. 协同平台字段扩展排期与负责人确认 4. 其他相关决策
- 每条决策记录决策人、时间、关联项目/任务、状态（执行中）等信息。

三、Demo 说明与边界

1. **当前 demo 已实现的核心能力**： - 监听群聊消息，自动识别新需求、需求变更、决策、状态更新、开工/完工反馈； - 自动在多维表格中新建/更新任务； - 自动识别资源冲突并给出风险提醒； - 支持被 @ 后更新决策日志； - 支持以数据看板、任务列表、看板视图等多种形式展示项目状态； - 支持按日 / 周定时主动推送工作播报：每日汇总「今日工作 + 待办提醒」，每周输出「周总结 + 需求进展提醒」，无需被 @ 也能主动同步项目状态。
2. **当前仍属演示性质**： - 群内角色智能体为模拟成员，用于验证 Agent 对多人对话的理解能力； - 任务数据为演示数据，不代表真实业务系统状态； - 决策日志、风险提醒等能力仍需在真实业务场景中进一步验证和调优。
3. **后续如需落地，建议结合真实场景继续优化**： - 接入真实项目群与真实成员； - 与商机广场 / 手拉手协同平台等业务系统打通，形成「群里确认 → 系统落库」的闭环； - 根据团队反馈持续优化消息识别准确率、合并建议质量、风险提醒阈值等。

文档状态：Demo 操作展示说明，与《工作说明.md》《飞书项目管理 Agent-PRD.md》《飞书项目管理 Agent-需求拆解.md》配套使用。
